


令和7年度 進捗状況

- 計画推進に向けた実施体制を整備し、基本計画・仕様検討を実施しました。また各導入設備の仕様検討を進めました。
- 周辺エリアとの連携に関しては、自治体と今後の進め方に関する協議を開始し、近隣へ取り組みの紹介を実施しました。
- 事業者採択、事業開始に関して弊社HPにて周知を行いました。
<https://www.takenaka.co.jp/newslog/2026/02/01/>

令和8年度 取り組み予定

- 各設備導入に向けた補助金申請を実施します。
- 導入設備の詳細設計を進め、機器選定と発注、施工方法などを固めていきます。
- 技術開発を伴う設備に関して詳細仕様を決定し、製作を開始します。
- 自治体との連携や協定に向けて協議を進めていきます。また周辺エリア連携に向けて弊社内の地域貢献活動を含めた展開を検討します。
- 事業の進捗に関するHP等への掲載や、展示会やセミナー等による取り組みの紹介を検討します。

マイクログリッド実装前(令和7年度末時点)

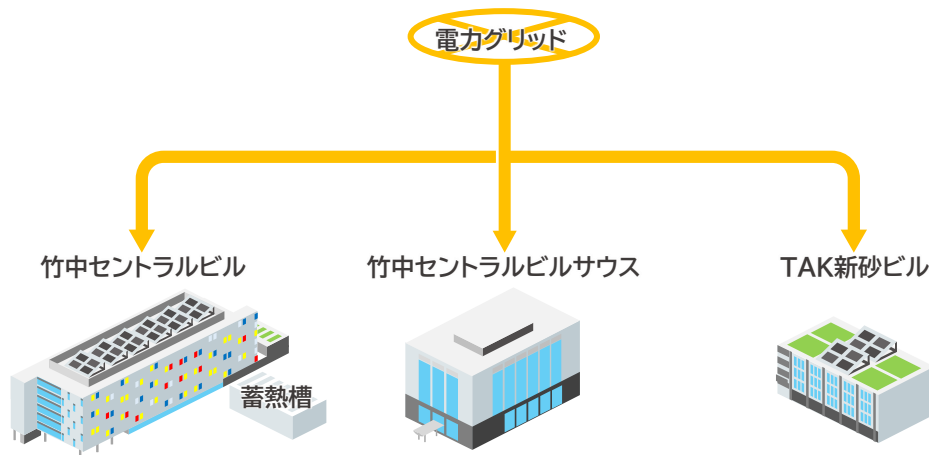

マイクログリッド実装時(令和10年度末)

